Master plan programme

West Suffolk College

23/03/2006

Pick Everard

Line	Name	Duration	Start	End
1	**Arts and Sciences Building Construction period**	54w	18/04/2006	11/05/2007
2	**New access road**	16w 1d	24/02/2006	22/06/2006
3	**Managed Parkland**	384w 1d	27/02/2006	30/08/2013
4	**Sunshine Nursery Building**	**30w 4d**	**15/12/2005**	**27/07/2006**
5	Design	14w 4d	15/12/2005	31/03/2006
6	Construction	16w	03/04/2006	27/07/2006
7	**Academy of Dramatic Arts Building**	**66w**	**27/02/2006**	**19/06/2007**
8	Design	23w 1d	27/02/2006	11/08/2006
9	Construction	43w	11/08/2006	19/06/2007
10	**Higher Education Building**	**88w 4d**	**03/01/2007**	**02/10/2008**
11	Associated Demolition - Burma House	7w 4d	30/07/2007	21/09/2007
12	Design	36w 2d	03/01/2007	20/09/2007
13	Construction	52w 2d	21/09/2007	02/10/2008
14	**Technical Services Building Phase 1**	**63w**	**02/07/2007**	**25/09/2008**
15	Associated Demolition - Edmund House	12w	20/09/2007	12/12/2007
16	Design	23w 3d	02/07/2007	13/12/2007
17	Construction	37w	04/01/2008	25/09/2008
18	**Two level car park**	**58w 2d**	**09/06/2008**	**31/07/2009**
19	Associate Demolition - ITC and Mechatronics	9w	02/01/2009	05/03/2009
20	Design	24w 3d	09/06/2008	27/11/2008
21	Construction	21w 2d	27/02/2009	31/07/2009
22	**Main Building**	**144w 2d**	**31/10/2008**	**01/09/2011**
23	Design	40w 3d	31/10/2008	20/08/2009
24	Construction	71w	04/09/2009	27/01/2011
25	Associated demolition - Australia House	12w	10/06/2011	01/09/2011
26	**Cafe in the Park/Library Building**	**76w**	**07/01/2011**	**21/06/2012**
27	Associated demolition - Substation	4w	29/07/2011	25/08/2011
28	Design	29w	07/01/2011	28/07/2011
29	Construction	42w	02/09/2011	21/06/2012
30	**Technical Services Building Phase 2**	**81w**	**20/01/2012**	**08/08/2013**
31	Associated Demolition - Edmund House etc	17w	06/07/2012	01/11/2012
32	Design	24w	20/01/2012	05/07/2012
33	Construction	40w	02/11/2012	08/08/2013
34	**Site entrance/estate road system**	380w 1d	31/03/2006	05/09/2013
35	**Future expansion buildings**	103w	06/09/2013	27/08/2015

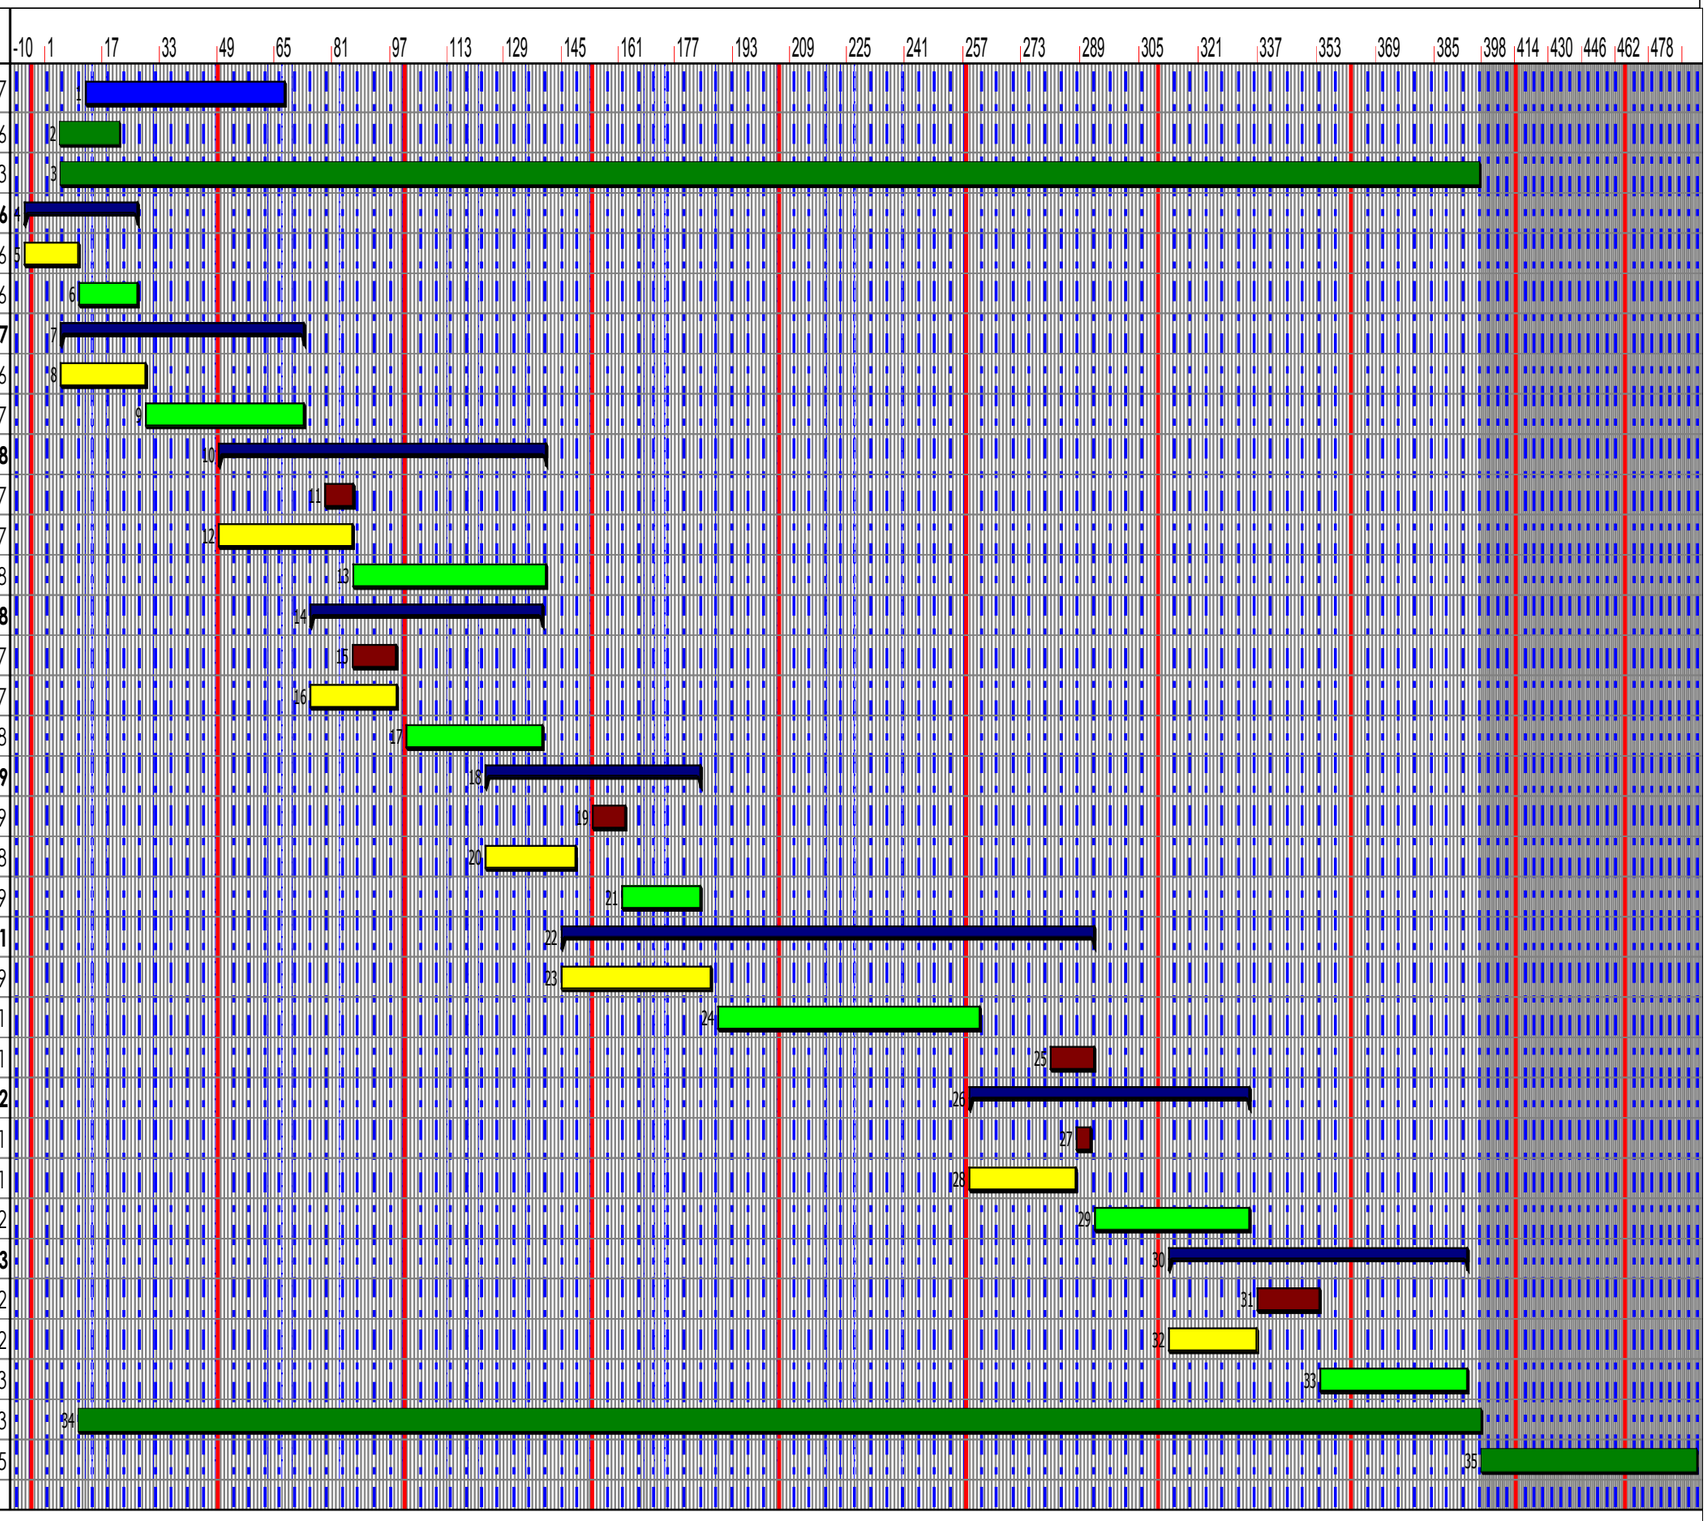

Responsibilities

Pick Everard | Summary | Design | Construction | Demolition
